



Prosjektplan for Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer



Innhald:

1	<i>Bakgrunn</i>	2
2	<i>Mål for arbeidet</i>	2
3	<i>Avgrensing av arbeidet</i>	2
3.1	Tematisk:	2
3.2	Geografisk:	2
3.3	Organisatorisk forankring	2
4	<i>Organisering av arbeidet</i>	3
5	<i>Økonomi</i>	3
6	<i>Medverknad</i>	3
7	<i>Innarbeiding i kommunen sitt planverk</i>	4
8	<i>Annan etterbruk</i>	4
9	<i>Framdriftsplan</i>	5



1 Bakgrunn

Hareid kommune har eit unikt friluftsområde. Området brukast aktivt av innbyggjarane og tilreisande. Fleire av ferdselsårane krysser kommunegrensa til Ulstein kommune. I 2018 vart friluftsområder i kommunen kartlagt, og frå 2022 er kommunen ein del av Stikk-Ut!. Hareid kommune sitt fokus på friluftslivets ferdselsårer må sjåast i samband med verdiar knytta til bolyst (folkehelse - kultur - landskap).

Folkehelsekoordinator søkte og fekk i juni 2022 innvilga kr 50000,- i prosjektmidlar frå fylkeskommunen til Plan for friluftslivets ferdselsårer. Målet var å gjennomføre kartfesting av rutenett og utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer.

Plan-avdelinga i Hareid kommune har ikkje hatt kapasitet til å bistå i arbeidet, og det har difor lagt på vent. No er det oppretta eit samarbeid med Ulstein kommune der det kan utarbeidast ein felles plan for heile Hareidlandet. Det vil vere formålstenleg ettersom mange av ferdselsårene går på tvers av kommunegrensene.

Det er avklart med fylkeskommunen at ein felles plan vil bli godkjent.

2 Mål for arbeidet

Det overordna målet med prosjektet er å identifisere, ivareta, og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre eit attraktivt tilbod til befolkninga med tanke på folkehelse, livskvalitet, bulyst og reiseliv. Vi vil utarbeide ein felles plan for Hareidlandet i samarbeid med Ulstein kommune, men med kvar vår tiltaksplan.

Effektmål:

- Auka fysisk aktivitet og betre helse i befolkninga
- Gjere kvardagsturen til eit omgrep i Hareid kommune.
- Auka miljøomsyn gjennom færre og kortare fritidsreiser med privatbil i kvardagen.
- Sikre berekraftige og miljøvenlege ferdselsårer.

Resultatmål:

- Alle skular, barnehagar og eldrecenter skal ha ein turveg/sti eller turrute tilpassa deira bruk i nærområdet.
- Tydeleg skilting og merking av turruter.
- Lett tilgjengelege og samanhengande turnettverk i nærområdet, maks 500 m til startpunkt frå tettbebyggelsen.
- God parkering i tilknytning til turrutene.
- Få oversikt over eksisterande snarveggar og legge til rette for å sikre desse gjennom plan.
- Varierte turmål tilpassa ulike brukargrupper. Minst to universelt utforma turmål.
- 1-2 padleleder som er graderte i hht «Veileder for ro- og padleruter»
- Tilgjengelege turkart på nett som vert søkt opp av mange. Alle turruter i kommunen skal leggjast inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter. (og gjerne andre tursider som morotur.no, ut.no, Wikiloc m.fl.)

3 Avgrensing av arbeidet

3.1 Tematisk:

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal omhandle fylgjande bruk: fotturar, ev. skiturar, sykling, riding og padling. Ferdselsårene som vert teke med i planen skal vere mykje brukt, eller av andre årsaker vere godt kjende.

Element som elles skal kartleggast er kvilebenkar, gapahukar, bålplassar, drikkevasskjelder, utsiktspunkt, parkering, sjåverdigheiter og liknande.

3.2 Geografisk:

Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer skal ta for seg heile Hareidlandet. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Ulstein kommune.

3.3 Organisatorisk forankring

Kommunedirektøren er prosjekteigar. Ansvaret for arbeidet leggjast til eining for næring, kultur og busetting som har ansvar for den praktiske gjennomføringa.



4 Organisering av arbeidet

Arbeidet organiserast som et prosjekt med følgende organisering:

Styringsgruppe:

Strategisk planforum i Hareid kommune

Prosjektleder: Folkehelsekoordinator, pr dags dato
Silje Kiperberg Aksnes

Prosjektgruppe (felles med Ulstein kommune):

Prosjektleder Ulstein: Anita Sundnes

Ingeniør miljøvern: Arild Støylen

GIS-ingeniør: Oda Jonette Hofset

Planleggar: Cecilie Roppen

Døme på ressurspersonar/-grupper:

Sunnmøre Friluftsråd

Skular/barnehagar

Hareid Rotaryklubb

Lions

Hareid sanitet

Hareid Ride og køyrekubb

Sykkelklubben

Hareid og Ulstein jeger- og fiskarforeining

Velforeiningar/grendalag

Hareidlandet Triatlon

Hareid IL Trimgruppa

Hjørungavåg IL Trimgruppa

Brandal IL

Naturvernforbundet på Søre Sunnmøre

Hafest

Nordvest maraton

Ildsjeler/private ressurspersonar

Område der ikkje idrettslag eller utmarkslag eksistere vil andre relevante lag og foreningar bli kontakta. Arbeidsgruppa møtast ved dei punkta som er sett i framdriftsplanen. Arbeidsgruppa kan trekke inn ressurspersonar ved behov.

5 Økonomi

Folkehelsekoordinator søkte og fekk innvilga kr 50.000 i tilskot til prosjektet i 2022 frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Kostnadene i prosjektet vil vere knytt til medverknad og kommunikasjon, timebetaling for GIS-ingeniør i Ulstein kommune, samt tidsbruk for administrasjonen.

6 Medverknad

Oppstart skal annonserast på kommunen sin facebook- og nettside. I annonseringa skal det vere ei kort forklaring av kva målet med arbeidet er og korleis ein har tenkt gjennomføringa. Det skal også komme klart fram at alle er velkomne til å kome med innspel og kommentarar undervegs. Under kartlegginga av nositasjonen er det arrangert eit møte med idrettslag, grunneigarlag og andre som har god oversikt over ferdelsårene. Aktuelle organisasjonar kontaktast direkte for å sikre at kjent kunnskap er kartfesta. Under arbeidet med vurdering av tiltak leggest det opp til dialogbaserte medverknadsmetoder hjå dei same som var involvert i kartlegginga av nositasjonen. I tillegg skal grunneigarar og interessentar som vert særleg røyrd av eventuelle nye forslag, gjevast anledning til å delta i arbeidet og påverke resultatet. Høyring sendast som eit minimum ut til dei som har vore involvert i arbeidet som ein kvalitetssjekk på ferdig kartlegging med tiltaksanbefaling. Planen vert også lagt ut til offentlig ettersyn.

Det digitale kartverktøyet for medverknad, Esri, skal nyttast for innspel/kommentarar. Her kan alle innbyggjarar gå inn og gi innspel. Fylkeskommunen vil bistå med tilpassing av dette verktøyet for Hareid og Ulstein kommunar.




7 Innarbeiding i kommunen sitt planverk

Resultata frå «Plan for kartlegging av friluftslivets ferdselsårer» kan innarbeidast i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og gjevast sin planforankring der.

8 Annan etterbruk

Planen skal gi ei oversikt over stiar og løyper som eksisterer, bidra til tilrettelegging for nærturar og til å kanalisere ferdsel av omsyn til sårbart naturmangfald. Planen kan danne grunnlag for utarbeiding av turkart. Planen kan vidare gi grunnlag for val av kva ferdselsårer og friluftsområde, som bør vidareutviklast, eventuelt nyetablerast. Planen vil også gi eit betre grunnlag for tilskotssøknadar om ekstern finansiering.

Kartlegginga vil også danne kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel og nyttast i kommunen sin sakshandsaming.

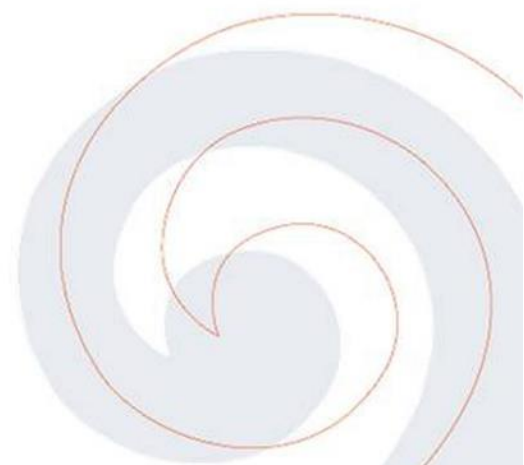



9 Framdriftsplan

Milepåle	Tidspunkt	Ansvar	Oppgåver	Møter
Prosjektplan	Innan 01.april	Prosjektleder	Utarbeide prosjektplan	Prosjektgruppa
Annonsering oppstart	Innan 15. april	Prosjektleder	Informasjon på kommunen sin facebook- og nettside, samt annonse i Vikebladet	
Kartlegging av nosituasjon-internt	Februar-mai	Prosjektleder	Gjennomgang av eksisterande grunnlag, få oversikt. Kartlegge ressurspersonar/grupper	Prosjektgruppa
Kartlegging av nosituasjon-eksternt	April-juni	Prosjektleder	Kartlegging gjennom kontakt med eksterne partar. Ope møte 19. april med ulike interessentar. Gjennomgang av kartlagde ruter. Korrigering og supplering. Forslag til tiltak.	Prosjektgruppa Ressursgrupper
Politisk forankring	Innan 11. mai	Prosjektleder	Politisk sak NMU og kommunestyret; Godkjenne prosjektplanen.	
Forslag til tiltak	Innan august	Prosjektleder	Få fram forslag til endringar og kompletteringar. Tett dialog med ressurspersonar/grupper.	Styringsgruppa
Vurdere og analysere tiltak opp mot mål for arbeidet.	August	Prosjektleder	Gjennomføre analyser	Møte i prosjektgruppa
Samanstilling og utskrivning av planen	August/september	Prosjektleder	Legge fram planen for godkjenning av høyringsutkast.	Godkjenning i styringsgruppa
Høyring	September	Prosjektleder	Nettside, facebook, evt. Vikebladet, Esri. Ressursgrupper	Godkjenning i styringsgruppa
Ev. korrigering etter høyring	November	Prosjektleder		PG/SG
Vedtak av plan	Desember 2023/ januar2024	Prosjektleder	Prioritering av tiltak	politisk
